

CERTIFICA



ESCUELA DE POSGRADO  
Universidad Nacional De Piura

PROMUEVE



FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO  
DEL NORTE DEL PERÚ

ORGANIZA



CACP PERÚ  
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

**DIPLOMADO**


# Gestión en Residencia,

Supervisión, Liquidación y  
**Prevención de Riesgos en**  
seguridad y salud  
ocupacional en obras


 INICIO  
ABRIL **05**

 Certifica  
Universidad  
Nacional de Piura  
Escuela de Posgrado


 **448 HORAS**  
LECTIVAS  
24 CRÉDITOS

 **Domingos**  
desde las 9:00 a.m.

MODALIDAD  
SEMI PRESENCIAL 





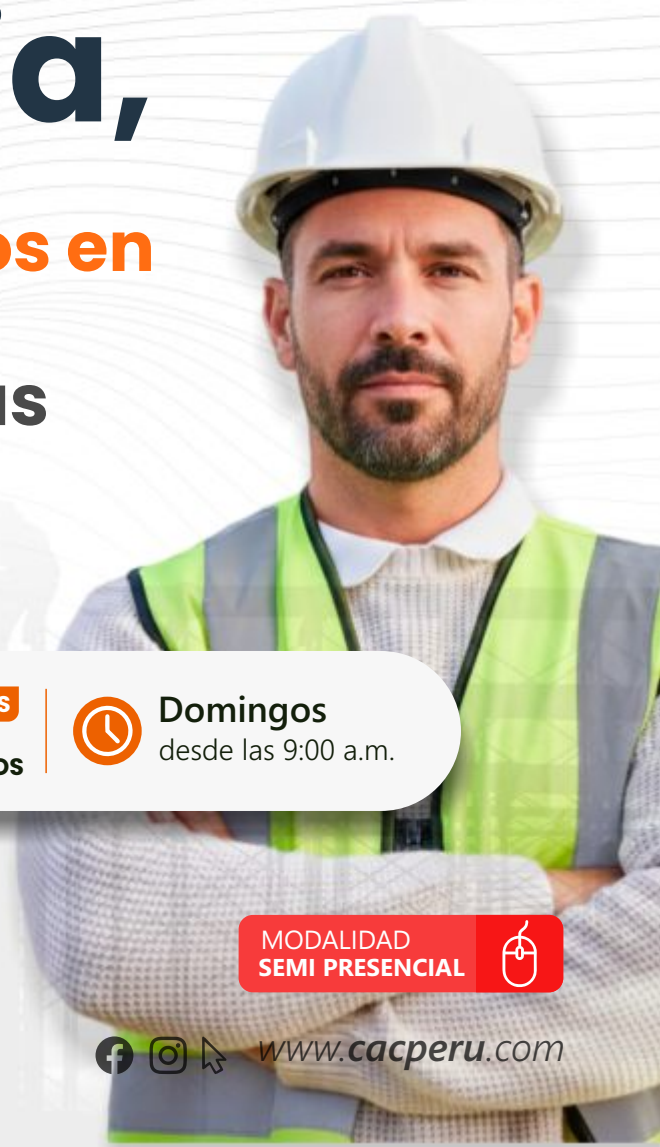


  953 620 444

   [www.cacperu.com](http://www.cacperu.com)



# Información General

## Gestión en residencia, supervisión, liquidación y prevención de riesgos en seguridad y salud ocupacional en obras

-  **Inicio:**  
05 de abril de 2026
-  **Duración:**  
06 Meses
-  **Horario**  
Domingos (9:00 a.m)
-  **Horas y Créditos:**  
448 horas lectivas y 24 créditos
-  **Certifica**  
Escuela de Posgrado  
**Universidad Nacional de Piura**
-  **Modalidad:** **SEMI PRESENCIAL** 

ORGANIZA



**CACP PERÚ**  
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

CERTIFICA



ESCUELA DE POSGRADO  
Universidad Nacional De Piura



## Reciban un cordial saludo de parte de la Gerencia General de CACP PERÚ

Somos una plataforma educativa profesional comprometida con la excelencia académica y el fortalecimiento técnico de los profesionales de ingeniería. Contamos con herramientas modernas y una plana docente de alto nivel que impulsa el desarrollo académico y práctico de nuestros alumnos a través de programas virtuales especializados.

Nuestra plataforma virtual ofrece beneficios concretos: acceso flexible, optimización del tiempo de estudio, comodidad, variedad de programas técnicos, calidad audiovisual, precios accesibles e interacción directa con especialistas del sector. Como institución profesional, nos enfocamos en brindar programas de especialización de alta demanda técnica, diseñados para mejorar las competencias de los profesionales y potenciar su desempeño en proyectos reales. Buscamos que cada alumno aplique los conocimientos adquiridos de manera efectiva.

Desde la Dirección Académica, trabajamos continuamente en la elaboración de mallas curriculares y contenidos rigurosos, actualizados y alineados a las necesidades reales del sector construcción, minero, geotécnico y de ingeniería en general.



**CACP PERÚ**  
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

## Mijail Nuñez Gomez

Gerente General



DIPLOMADO

## GESTIÓN EN RESIDENCIA, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRAS.



### » PRESENTACIÓN

Este diplomado brinda una formación integral y especializada orientada a fortalecer las competencias técnicas, legales y operativas de los profesionales que participan en la ejecución, control y fiscalización de obras públicas y privadas, abordando de manera práctica la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento vigente, el sistema Invierte.pe en todas sus fases, la correcta gestión del cuaderno de obra físico y digital, la mejora de la productividad mediante Lean Construction, los procedimientos de valorización y liquidación de obras conforme a la normativa actualizada, la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el sector construcción, así como las funciones y responsabilidades del residente, inspector y supervisor de obra.



### » DIRIGIDO A

Gerentes y administradores de proyectos de la construcción y jefes de área. Ingenieros civiles y arquitectos residentes y supervisores de obras. Profesionales relacionados con proyectos constructivos. Bachilleres y estudiantes universitarios de últimos ciclos.



### » CERTIFICA

Los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos Académicos y Administrativos del programa: "**GESTIÓN EN RESIDENCIA, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRAS**", recibirán la certificación por la Escuela de Posgrado de la **Universidad Nacional de Piura**.



**CACP PERÚ**  
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN



### BENEFICIOS:



Diploma expedido por la Escuela de Posgrado de la **UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA** UNIVERSIDAD ACREDITADA



Incluye envío de materiales a todo el Perú hasta su domicilio (Olva Courier)



Audio y video en **alta definición FHD**



Tutoría permanente con los **mejores ponentes**.



**Videokonferencias en USB**



953620444 - 918343626 - 932323968



info@cacperu.com



www.cacperu.com

## Nuestras modalidades

### Presencial



Esta modalidad consiste en que el alumno asista como mínimo al 90% de las clases teóricas - prácticas. Se les brindará un manual en físico por clase y la información en digital estará disponible en el aula virtual

### ONLINE



Clases vía



Curso en tiempo real

#### ■ Las clases virtuales se dictarán a través de la plataforma ZOOM

En la cual podrás:

- Estar frente a frente con el ponente.
- Realizar preguntas o comentarios al ponente en tiempo real (hablado o por chat).

#### ■ Clases a través del AULA VIRTUAL CACP PERÚ

En la cual podrás:

- Visualizar las transmisiones en vivo en nuestra sede (En calidad FULL HD, EN VIVO).
- Interactuar en tiempo real con el ponente (A través del chat del Aula Virtual)

## VENTAJAS DEL AULA VIRTUAL - CACP PERÚ



#### INTRANET

Donde podrá visualizar las ponencias en calidad FULL HD, cronogramas de clases, próximos eventos, calificaciones obtenidas y más.



#### VIDEOCONFERENCIAS

Interacción en tiempo real entre el alumno y el ponente.



#### ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

A través de nuestro campus virtual CACP PERÚ con acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.



#### FLEXIBILIDAD DE ESTUDIO

De acuerdo con su disponibilidad de tiempo.



La clase quedará grabada para uso posterior del alumno



Contarás con material de apoyo y elementos adicionales

[www.cacperu.com/aulavirtual](http://www.cacperu.com/aulavirtual)

# Módulos

- MOD I.** CUADERNO DE INCIDENCIAS EN OBRAS FÍSICO Y DIGITAL SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO - LEY 32069.
- MOD II.** PRODUCTIVIDAD EN OBRAS CON LEAN CONSTRUCTION.
- MOD III.** VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONTRATA. SEGÚN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES N° 32069, REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES D.S. N° 001-2026-EF.
- MOD IV.** GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
- MOD V.** RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS.
- MOD VI.** EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO N° 32069 -2025-EF.
- MOD VII.** SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES - INVIERTE.PE.

<sup>1)</sup> Las fechas establecidas en el cronograma pueden ser cambiadas por causas fortuitas y/o otros motivos.

<sup>2)</sup> El contenido de los módulos pueden variar o ajustarse por indicación del ponente.

<sup>3)</sup> En caso de presentarse algún inconveniente con los expositores, estos podrían ser reemplazados por docentes de su mismo nivel académico y profesional.

<sup>4)</sup> La modalidad de estudio puede variar según disposición del ponente.



## CUADERNO DE INCIDENCIAS EN OBRAS FÍSICO Y DIGITAL SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO – LEY 32069

📅 05/04/2026

### TEMA 01: CUADERNO DE INCIDENCIA EN OBRA

- Concepto

### TEMA 02: CUADERNO DE INCIDENCIA POR CONTRATA

- Apertura del cuaderno de incidencia.
- Profesionales autorizados para registrar en el cuaderno de incidencia.
- Conformación del cuaderno de incidencia.
- ¿Quién se queda con el cuaderno de incidencia concluida la obra?.
- Anotación en el cuaderno de incidencia.
- Cierre del cuaderno de incidencia.
- Consultas sobre ocurrencias.
- Supervisor no absuelve las consultas.
- Proyectista absuelve consultas.
- Procedimiento de llenado.
- Al inicio.
- Durante la ejecución.
- Al concluir la obra.

### TEMA 03: CUADERNO DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

- Procedimiento de llenado.
- Al inicio.
- Durante la ejecución.
- Al concluir la obra.

### TEMA 04: DIFERENCIA DE LLENADO DE CUADERNO DE OBRA POR CONTRATA Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA

- Contenido del conmutador.

### TEMA 05: ERRORES Y DELITOS QUE SE COMETEN ANTE UN MAL MANEJO DEL CUADERNO DE OBRA

- Responsabilidades.
- Administrativa.
- Civil.

- Penal.
- Delitos.
- Colusión.
- Peculado.
- Malversación.

### TEMA 06: HALLAZGOS QUE SE DETECTAN EN EL CUADERNO DE OBRA

- El cuaderno de obra no se encuentra físicamente en obra.
- El cuaderno de obra no se encuentra al día.
- Los asientos se realizan con una letra poco legible.
- Hojas y espacio en blanco.
- Presentan borrones y/o enmendaduras.
- Se realizan asientos sin haber estado en obra el día que indica el asiento respectivo.
- Se registran los asientos sin considerar los detalles de las principales ocurrencias de obra en el día.
- Se registran hechos que no ocurrieron en obra.
- Se registran especificaciones técnicas diferentes a lo ocurrido en obra.

### TEMA 07: CUADERNO DE OBRA DIGITAL

- Introducción
- ¿Qué se registra en el cuaderno de obra digital?
- Registro de asiento del cuaderno de obra digital.
- Campos del cuaderno de obra digital.
- Registro de asiento cuaderno de obra.
- Acciones de asiento del cuaderno de obra digital.
- Detalle de asiento.
- Enlazar asiento.
- Registro de asiento en estado borrador.
- Acciones del asiento en estado borrador.





## PRODUCTIVIDAD EN OBRAS CON LEAN CONSTRUCTION.

📅 26/04/2026, 17/05/2026 y 31/05/2026

### TEMA 01: INTRODUCCIÓN, FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION

- Sinopsis del Curso Lean Construction
- Introducción a Lean Construction
- Principios de la Filosofía Lean - Eliminar el desperdicio (waste)
- Principios de la Filosofía Lean - Valor y Cadena de Valor

### TEMA 02: PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA LEAN CONSTRUCTION II

- Eliminar los pasos que no agregan valor
- Perfeccionamiento continuo para mejorar los procesos
- Desarrollo histórico de la planificación
- Ordenamiento y programa de construcción

### TEMA 03: PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS TRADICIONALES

- WBS Mallas Flecha Actividad
- Mallas Nodo Actividad
- Visión General Herramientas Lean Construction / Introducción a Mapeo de procesos de construcción.
- Diagramas de Flujo (Flowcharting)

### TEMA 04: HERRAMIENTAS LEAN CONSTRUCTION: MAPAS DE PROCESOS

- Introducción al Mapa de Cadena de Valor (VSM)
- Ejemplos de VSM en Construcción
- VSM y sustentabilidad
- Explicación Trabajo VSM y paso a paso VSM

### TEMA 05: VSM: MÁS QUE MEJORAS PRODUCTIVAS

- Desarrollo Práctico de VSN en Construcción
- Variabilidad e Introducción al Sistema Last

- Planner
- Juego Parade of Trades
- Sinopsis Sistema Last Planner

### TEMA 06: SISTEMA LAST PLANNER (LPS)

- Principales Elementos del Sistema Last Planner en Lean Construction
- Indicadores del Sistema Last Planner y sus 3 niveles de planificación en Lean Construction
- Reunión de planificación, el Motor de LPS
- Ejemplo de Implementación LPS - LPS/BIM

### TEMA 07: HERRAMIENTAS LEAN BÁSICAS

- Just in Time
- Total Quality Management
- Diagramas Causa y Efecto y Check Sheet
- Tablas de control estadístico

### TEMA 08: OTRAS HERRAMIENTAS LEAN

- Histograma y Diagrama de Pareto
- Scatter Diagram y Estratificación
- Benchmarking
- 5S Visual Management

### TEMA 09: OTRAS HERRAMIENTAS Y CAMINO RECORRIDO

- Poka Yoke
- Failure Mode Effect Analysis (FMEA)
- Resumen Final Lean Construction - Parte 1
- Resumen Final Lean Construction - Parte 2



## VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONTRATA. SEGÚN LA NUEVA LEY DE CONTRATACIONES N° 32069, REGLAMENTO Y SUS MODIFICACIONES D.S. N° 001-2026-EF.

📅 14/06/2026 y 28/06/2026

### TEMA 01: VALORIZACIÓN DE OBRAS POR CONTRATA

#### 1.1 VALORIZACIÓN

- Definición
- Tipos
- Valorización según modalidad de pago
- Presentación de la valorización
- Revisión de la valorización
- Pago de la valorización
- Formula polinómica
- Reajuste
- Contenido de informe de valorización.
- Valorización de obra adelantada
- Cambio de base RJ#016-2026-INEI

#### 1.2 ELABORACIÓN DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA ADELANTADA

- Definición
- Cálculo de la valorización
- Comparación de los avances: avance real acumulado y avance programado
- Acumulado
- Coeficiente de reajuste (fórmula polinómica)
- Cálculo de los reajustes programados, ejecutados y reconocido
- Intereses por la demora en el pago de las valorizaciones por la entidad
- Cuaderno de incidencias
- Resumen
- Monto a facturar del contratista
- Curva "s"
- Comentarios de artículos del reglamento de contratación del estado

- Liquidación de obra
- Uso de los índices unificados de precios del mes de pago de la valorización
- Reajustes recalculados
- Saldo a favor del contratista

#### 1.3.- ELABORACIÓN DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN CON ADELANTOS DIRECTO Y MATERIALES

- Cálculo del adelanto directo y materiales, insumos, mobiliario
- Comentario del Reglamento de Ley #32069
- Fecha que solicita los adelantos
- Fecha que la entidad cancela los adelantos
- Cálculo de la valorización
- Comparación de los avances: avance real acumulado y avance programado acumulado
- Cálculo de los reajustes programados, ejecutados y reconocido
- Cálculo de la deducción
- Cálculo de la amortización
- Monto a facturar del contratista
- Curva "s"
- Liquidación de contrato de obra
- Uso de los índices unificados de precios del mes de pago de la valorización
- Reajustes recalculados
- Deducción recalculados
- Saldo a favor del contratista

### TEMA 02: VALORIZACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

#### 2.1.- Etapa de preparación

- 2.1.1- Revisión del expediente técnico
- 2.1.2.- Elaborar plan de abastecimiento de obra

#### 2.2.- Etapa de ejecución física de la obra

- 2.2.1 Inicio de ejecución física de obra
- 2.2.2 Cuaderno de obra
- 2.2.3 Provisión de bienes y servicios de acuerdo al calendario: almacén de obra

- 2.2.4 Informes de valorización de obra
- 2.2.5 Control de calidad durante la ejecución de obra
- 2.2.6 Modificaciones durante la ejecución física
- 2.2.7 Modificaciones de plazo de ejecución de obra
- 2.2.8 Culminación den obra
- 2.2.8 Liquidación de obra
- 2.3.- DESARROLLO DE CASUÍSTICA DE ELABORACIÓN DE VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN

## GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

📅 12/07/2026

### TEMA 01: LEY 29783: LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- Documentos y Registros obligatorios dentro del sistema de gestión
- de seguridad y salud en el trabajo.
- Derechos y obligaciones de los trabajadores.
- Derechos y obligaciones del empleador.
- Sanciones y multas por la Sunafil.

### TEMA 02: DS: 011-2019-TR. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN:

- Disposiciones generales
- Derechos y obligaciones de/la empleador/a.
- Planificación y Organización del SGSST.
- Comité, sub comité o supervisor /a de SST.
- Comité técnico de coordinación de SST.
- Pautas generales para la Investigación de accidentes de trabajo.

## RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

📅 26/07/2026

### TEMA 01: RESIDENTE DE OBRA

- 1.1.- Aspecto generales
- 1.2.- Revisión del expediente técnico
- 1.3- Expediente técnico
  - 1.3.1.- Generalidades
  - 1.3.2.- Componentes del expediente técnico
  - 1.3.3.- Videos
- 1.4.- Funciones específicas del residente
  - 1.4.1 Control técnico
  - 1.4.2 Control económico
  - 1.4.3 Control administrativo.
  - 1.4.4 Control de seguridad
- 1.5 Atribuciones y limitaciones
- 4.3.- sanciones y penalidades

### TEMA 02: CUADERNO DE INCIDENCIA EN OBRAS BAJO EL SISTEMA DE SOLO CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN.

- 2.1.- consulta sobre incidencias en obra bajo los sistemas solo construcción y diseño y construcción.
- 2.2.- conocimiento de marco normativo reglamento de la ley n°32069.
  - 2.2.1.- incumplimiento de contrato
  - 2.2.2.- penalidades
  - 2.2.3.- penalidad por mora en la ejecución de la prestación
  - 2.2.4- tipos de sistema de entrega de obras
    - A) solo construcción
    - B) diseño y construcción
    - C) diseño, construcción, operación y mantenimiento.
    - D) gestión de diseño y construcción al riesgo
    - E) gestión de diseño y construcción de agencia
  - 2.2.5.- modalidad de pago en ejecución de obras
    - A) suma alzada
    - B) precios unitarios
    - C) mixtos
    - D) costos reembolsable

Inicio de la ejecución contractual

- 2.2.6.- ejecución rápida (fast track)
- 2.2.7.- propuestos de cambio de ingeniería de valor (pciv)
- 2.2.8.- contratos estandarizados



A) fidic

B) nex

2.2.9.- monitoreo y control de obras

#### TEMA 03: ADELANTOS

A) a. Directo

B) a. Materiales, insumos, mobiliario

C) por avance

3.2.- fideicomiso

3.3.- valorizaciones y reajustes

A) pago de valorizaciones en contratos de obra bajo los sistemas de solo construcción y diseño y construcción

3.4.- ampliación de plazo contractual en obras

A) procedimiento de ampliación de plazo bajo los sistemas de solo construcción y diseño y construcción.

B) efectos de la ampliación de plazo de obras bajo los sistemas de entrega solo construcción y diseño y construcción.

3.5.- prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de entrega solo de construcción.

3.6.- prestaciones adicionales de obra bajo el sistema de entrega de diseño y construcción.

3.7.- recepción y liquidación de obra bajo los sistemas de solo construcción y diseño y construcción.

#### TEMA 04: INSPECTOR O SUPERVISOR

4.1.- aspectos generales

4.2.- medidas de control durante la ejecución contractual

4.2.1.- control previo a la ejecución de la obra

4.2.2.- control durante la ejecución de la obra

4.2.3.- control en el proceso de recepción y liquidación de obra

4.2.4.- elaborar la liquidación

## EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SEGÚN LA LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO N° 32069 -2025-EF.




16/08/2026 y 30/08/2026

- Contexto normativo de la Ley N° 32069 y su Reglamento.
- Segmentación de contrataciones.
- Elaboración de requerimientos.
- Estrategias de contratación.
- Evaluadores en la contratación de obras y consultorías.
- Expediente de contratación y elaboración de bases.
- Incentivos para proveedores en la contratación pública.
- Procedimientos de selección de obras y consultorías de obras.
- Procedimiento de formalización del contrato.
- Contrato de obra y contrato de consultoría de obra.
- Clausulas Obligatorias en Contratos.
- Garantías y adelantos en la ejecución contractual.
- Modificaciones Contractuales.
- Nulidad del contrato.
- Resolución del contrato.
- Penalidades.
- Recepción, conformidad y observaciones a la entrega.
- Obligación de pago y responsabilidades.
- Gestión de obras.
- Contratos Estandarizados.
- Condiciones establecidas para el Expediente técnico de obra.
- Modificaciones contractuales:
  - Adicionales.
  - Ampliaciones, intensificación y suspensión.
- Aplicación de ejecución rápida (fast track) en obras públicas.
- Valorizaciones y sistema de reajuste
- Recepción y liquidación de contratos de obra y consultoría.
- Metodologías colaborativas incluidas en el Reglamento.





## **SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES – INVIERTE.PE.**

 13/09/2026 y 27/09/2026

### **TEMA 01: ASPECTOS GENERALES**

- Decreto Legislativo N° 1252.
- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252.
- Directiva General del Decreto Legislativo N° 1252.
- Marco normativo complementario.
- Ciclo de Inversión.
- Órganos del SNPMGI.
- Funciones de los Órganos del SNPMGI.

### **TEMA 02: FASE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES**

- Objetivo y etapas de la Programación Multianual de Inversiones.
- Criterios para la programación multianual de inversiones.
- Indicadores de Brechas de infraestructura o servicios públicos.
- Elaboración y aprobación del Diagnóstico de Brechas.
- Elaboración y aprobación de los Criterios de Priorización.
- Elaboración y priorización de la Cartera de Inversiones.
- Aprobación del PMI.
- Consistencia del PMI (Proyecto de Ley y Ley de Presupuesto).
- Modificación de la Programación Multianual de Inversiones.

### **TEMA 03: FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN Y FASE EJECUCIÓN FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN.**

- Complejidad de PI y Documentos técnicos de formulación-evaluación.
- Elaboración y Registro de la Idea de Proyecto de Inversión.
- Elaboración de estudio de pre-inversión a nivel perfil:
- Naturalezas de intervención y denominación de un PI
- Identificación.
- Formulación.
- Evaluación.

- Fichas Técnicas para la Formulación y evaluación de proyectos de inversión.
- Metodologías e instrumentos sectoriales.

### **TEMA 04: IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE IOARR.**

- Complejidad de PI y Documentos técnicos de formulación-evaluación.
- Orientaciones Generales.
- Orientaciones Específicas por Tipo de IOARR.
- Proceso de identificación y registro de las IOARR.
- IOARR de emergencia

### **TEMA 05: FASE EJECUCIÓN.**

- Modalidades de Ejecución.
- Concepción técnica y consistencia de proyectos de inversión.
- Procedimientos para la ejecución de inversiones en el marco del invierte.pe.
- Registros del Expediente Técnico/Documento Equivalente.
- Registro de modificaciones antes de la aprobación del ET/DE (Formato 8-A y 8-C).
- Registros durante la ejecución física (Formato 8-A y 8-C).
- Registro del Cierre de inversiones (Formato 9).



## DOCENTES



### Ing. Mario Olortegui Iglesias

*Profesional Competente, comprometido con el trabajo, proactivo, con capacidad de dirigir personal y con buenas relaciones interpersonales, capaz de resolver problemas, con habilidades para la planificación, control de avance de obra, valorizaciones y planteamiento de adicionales. Siempre en constante preparación en la parte técnica y dirección de proyectos bajo los estándares del (PMI); actualizado con Diplomados de Gerencia de Obra, Geotecnia, Diseño Estructural, Ley de Contrataciones con el Estado 30225 y SSOMA.*



### Ing. Hazel Estremadoyro Sifuentes

*Ingeniero Civil colegiada, con 11 años de experiencia general profesional, 10 años en obras de construcción con funciones de residencia, supervisión, inspección técnica de obras y gerencia de proyectos de construcción; y 3 años de experiencia en el sector público, cumpliendo funciones relacionadas a servicios de control posterior a megaproyectos de infraestructura nacional, en la Contraloría General de la República del Perú.*



### Msc. Eli Jairo Gamarra Cormán

*AUDITOR LÍDER IRCA 45001 – TÜV Rheinland. Magister en Gestión de Riesgos Ambientales y Seguridad en las Empresas. Supervisor HSE Empresa DISAL – Compañía Minera Antamina. Gestión de Proyectos – Sexta Edición de PMBOOK GUIDE PMI – Pontificia Universidad Católica del Perú. Auditor Autorizado para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de SST – Ministerio de Trabajo. AUDITOR LÍDER IRCA 45001 – TÜV Rheinland. Consultor en diversas empresas del sector de construcción, transportes agroindustrial, pesca, financiera y minería.*



### Msc. Luis Diaz Huiza

*Maestro en Gerencia de la Construcción Moderna, en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ingeniero Civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Amplia experiencia en supervisión de Proyectos. Docente en cursos de ingeniería y proyectos. Co-Autor del Libro "Valorización, Liquidación de Obras y Cierre de Inversiones – 2da edición".*



## Diplomado

A nombre de la Universidad Nacional de Piura

### Escuela de Posgrado

Certifcate en:

**GESTIÓN EN RESIDENCIA, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN OBRAS.**

Diplomado con



**448 horas lectivas y 24 créditos**

Inscripción	Costo en Cuotas (6)	Certificación	Costo al Contado
S/ 100.00	S/ 200.00	S/ 200.00	S/ 1200.00

**PROMOCIÓN**  
**S/ 1000.00**  
HASTA EL 04 DE ABRIL DE 2026



## Segunda opción

Certificación a nombre de la


### Corporación de Asesoramiento y Capacitación Profesional

Inscripción	Costo en Cuotas (5)	Certificación	Costo al Contado
S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 100.00	S/ 550.00

Diplomado con



**384 horas académicas**



\*Modelo referencial



953620444 - 918343626 - 932323968



info@cacperu.com



www.cacperu.com

## MEDIO DE PAGO:



A nombre de:

**CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO  
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L**

\*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar S/. 5.00 por cada Transacción



A nombre de:

**CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO  
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L**

\*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar S/. 7.50 por cada Transacción



A nombre de:

**CORPORACIÓN DE ASESORAMIENTO  
Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L**

\*En caso de realizar pago mediante el banco adicionar S/. 7.50 por cada Transacción

## PAGOS CON YAPE:



A nombre de:

**MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ  
918328041**

## PAGOS INTERNACIONALES CON:



A nombre de: **MIJAIL ANDRE NUÑEZ GOMEZ**  
DNI: 44348728

## MATERIALES FÍSICOS SIN COSTO: \*SOLO A NIVEL NACIONAL



ENVÍOS A NIVEL INTERNACIONAL  
CON COSTO ADICIONAL: **Serpost**  
El Correo del Perú



# CACP PERÚ

## ASESORÍA Y CAPACITACIÓN



CACP PERÚ



CACPPERU.SRL



CACPPerú



CACPPerú

## INFORMES E INSCRIPCIONES

### SEDE NUEVO CHIMBOTE



953 620 444 - 918 343 626 - 932 323 968



Urb. Garatea Mz. 3 Lte. 10 - Av. Universitaria  
(A 1/2 cuadra de la IEP Pestalozzi) - Nuevo Chimbote



043-604932



info@cacperu.com



www.cacperu.com

RUC: 20600673310

CORPORACION DE ASESORAMIENTO Y CAPACITACION PROFESIONAL C.A.C.P. S.R.L.
